Region Stockholm

Datum	2018-12-20	Projektskede	-
Status	Godkänd	Infosäkerhetsklass	K1
Rev. beteckning	6.0	Diarienummer	FUT 2021-0886
Rev. datum	2025-02-11	Författare	Magdalena Nilsson

Bilaga 6. Åtagande avseende Förbifart Stockholm

Kontrollprogram grundvatten

Tunnelbana från Akalla till Barkarby

Åtagande avseende Förbifart Stockholm

Extern anläggning med avsänkningsvillkor.

Åtgärdsnivåer för grundvattenrör vid Förbifart Stockholms etableringsområde i anslutning till nya tunnelbanan. Åtgärdsnivåerna är satta av projekt Förbifart Stockholm.

Grundvattenrör	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
15A661BU	Undre	+16,23	+15,23
15A603RU	Undre	+16,23	+15,93

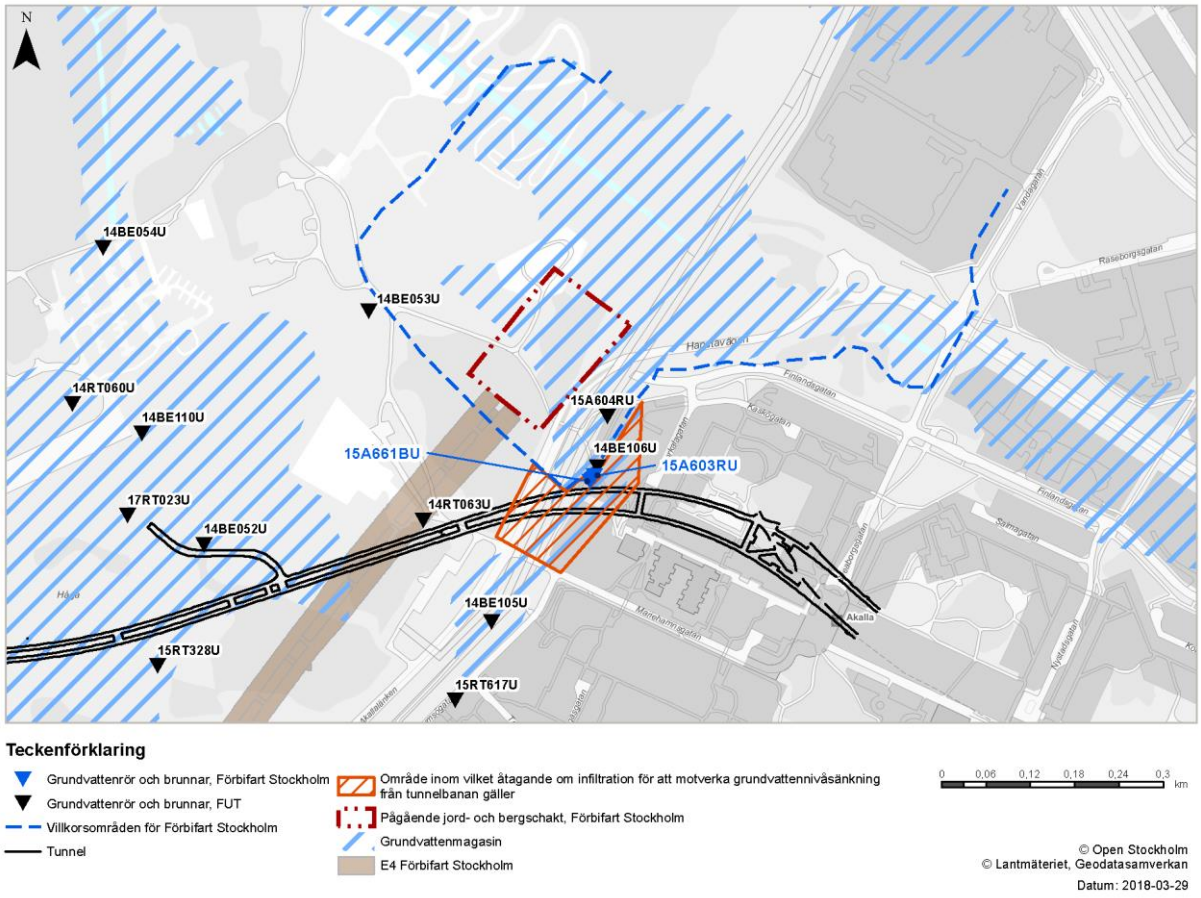

Förbifart Stockholms tunnel (brun) samt jord- och bergschakt (röd) med kringliggande villkorsområde (blåstreckad linje) vilket visar det maximala området Förbifart Stockholm tillåts avsänka nivåerna i det lokala grundvattenmagasinet (blåskrafferat). I anslutning till villkorsområdet visas en area (orangeskrafferad) där infiltration kan genomföras för att motverka grundvattennivåsänkningar som orsakats av nya tunnelbanan. Grundvattenrör med åtgärdsnivåer tillhör Förbifart Stockholm och visas i blått.
